

## 佐賀県東部広域ごみ処理施設建設検討委員会における検討内容等について

### 1 次期ごみ処理施設整備事業の経緯

鳥栖・三養基西部環境施設組合及び脊振共同塵芥処理組合の既存ごみ処理施設については、地元協定に基づき、ほぼ同時期に設置期限を迎えることとなっている。一方、国の指導のもと、佐賀県が策定したごみ処理広域化計画においては、鳥栖・三養基西部環境施設組合を構成する鳥栖市、上峰町及びみやき町の1市2町、脊振共同塵芥処理組合を構成する構成市町のうち神埼市及び吉野ヶ里町の1市1町の、2市3町の東部ブロックで広域化を進めることとなっている。このような中、平成26年11月に神埼市及び吉野ヶ里町から次期ごみ処理施設建設計画への参加申し入れがあったことにより、2市3町におけるごみ処理の共同処理について本格的な協議が始まった。そして、平成28年2月に地元真木町より2市3町による次期ごみ処理施設建設について同意を得たことに伴い「佐賀県東部ブロックごみ処理施設建設協議会」を設立して協議を重ね、基本的な事項の協議が整ったため、平成28年12月に「佐賀県東部地区ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する覚書」を締結した。次期ごみ処理施設整備事業におけるこれまでの経緯を表1に示す。

表 1 次期ごみ処理施設整備事業の経緯について

年月	事業の経緯（◆計画の策定等）
平成23年11月	「佐賀県ごみ処理広域化計画」に基づく東部ブロック研修会開催
平成26年2月	東部ブロック首長意見交換会開催
平成26年10月	鳥栖市から建設候補地の選定について報告
平成26年11月	鳥栖市真木町衛生処理場敷地を建設候補地として決定
〃	神埼市及び吉野ヶ里町から建設事業計画への参加申し入れ
平成27年3月	地元真木町で説明会を開始
平成27年12月	1市2町による施設建設について真木町の同意
平成28年1月 (平成28年3月承認)	◆循環型社会形成推進地域計画を提出 (1市2町、鳥栖・三養基西部環境施設組合)
平成28年2月	2市3町による施設建設について真木町の同意
〃	佐賀県東部ブロックごみ処理施設建設協議会設立
平成28年7月	神埼市及び吉野ヶ里町から鳥栖・三養基西部環境施設組合に対し、建設事業について事務委託
〃 (平成28年8月承認)	◆循環型社会形成推進地域計画を提出(対象地域拡大による変更) (2市3町、脊振共同塵芥処理組合、鳥栖・三養基西部環境施設組合)
平成28年12月	佐賀県東部地区ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する覚書締結 (2市3町)

## 2 次期ごみ処理施設建設予定地

住所：鳥栖市真木町（敷地面積 約 4.2ha）

建設予定地の位置図・案内図を図 1 に示す。

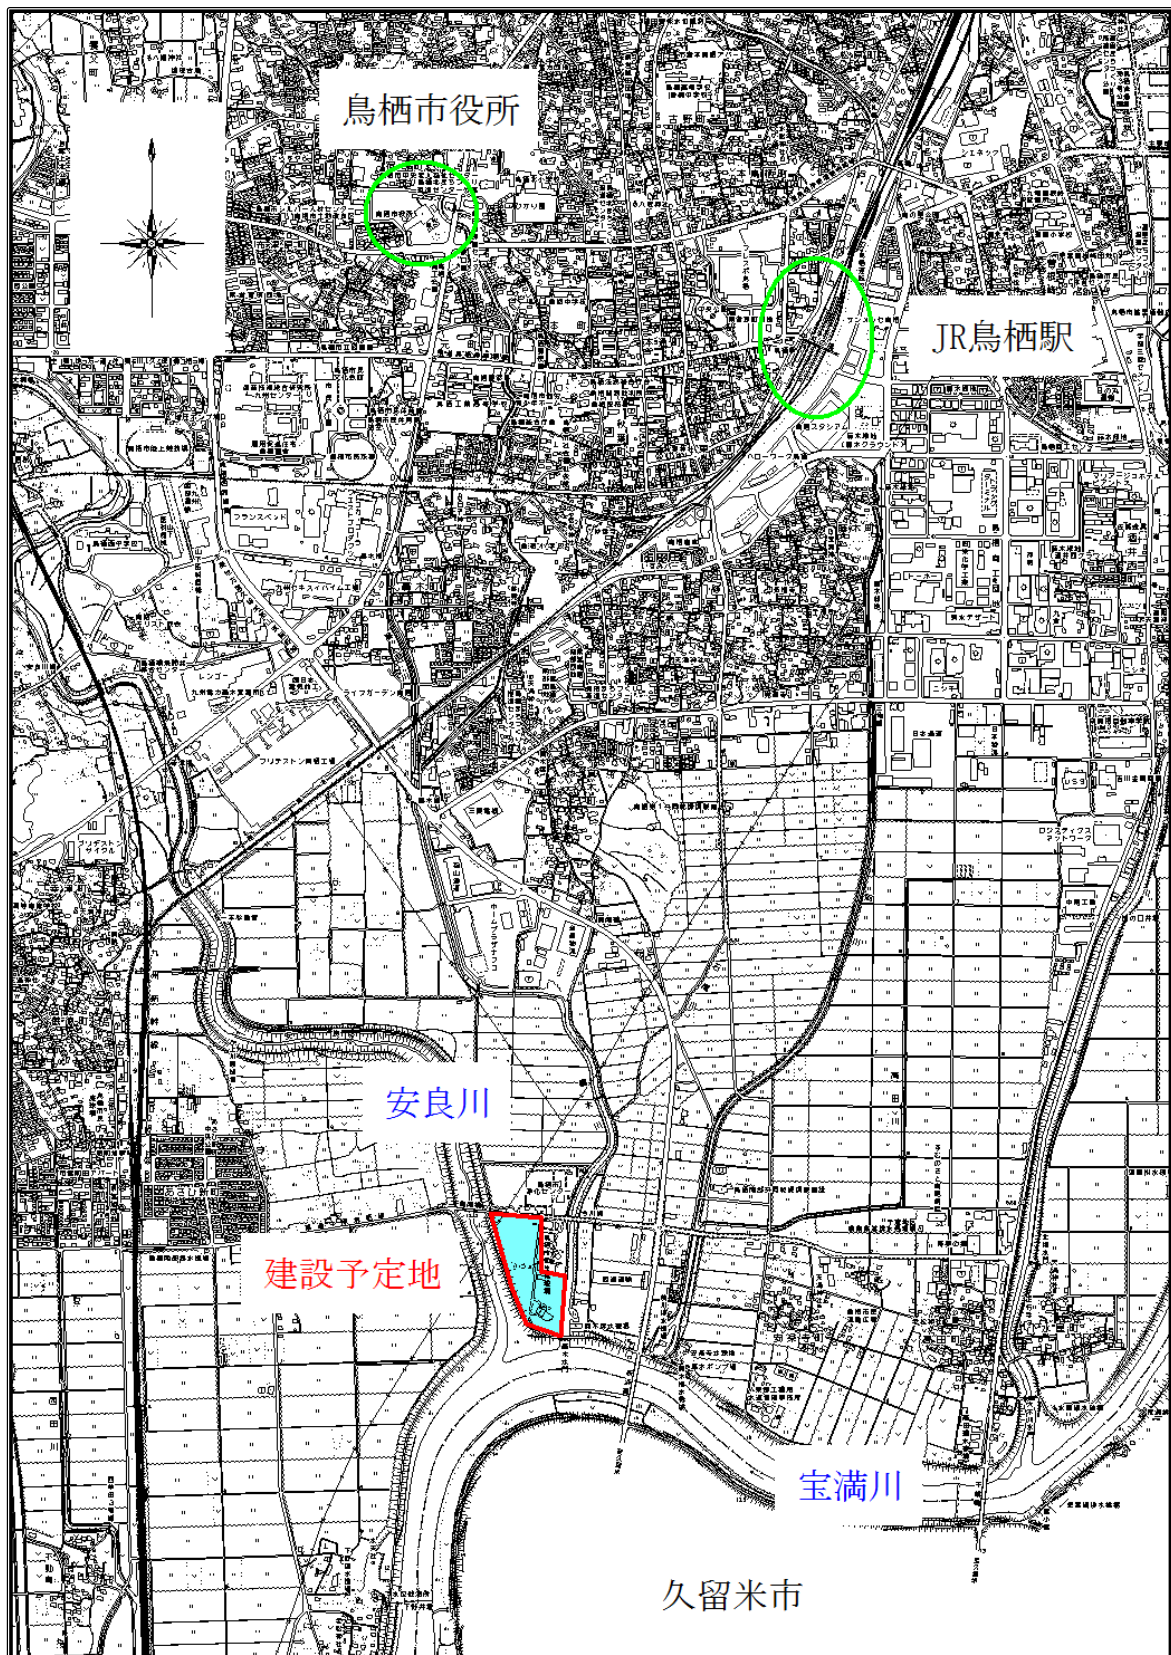


図 1 建設予定地位置図・案内図





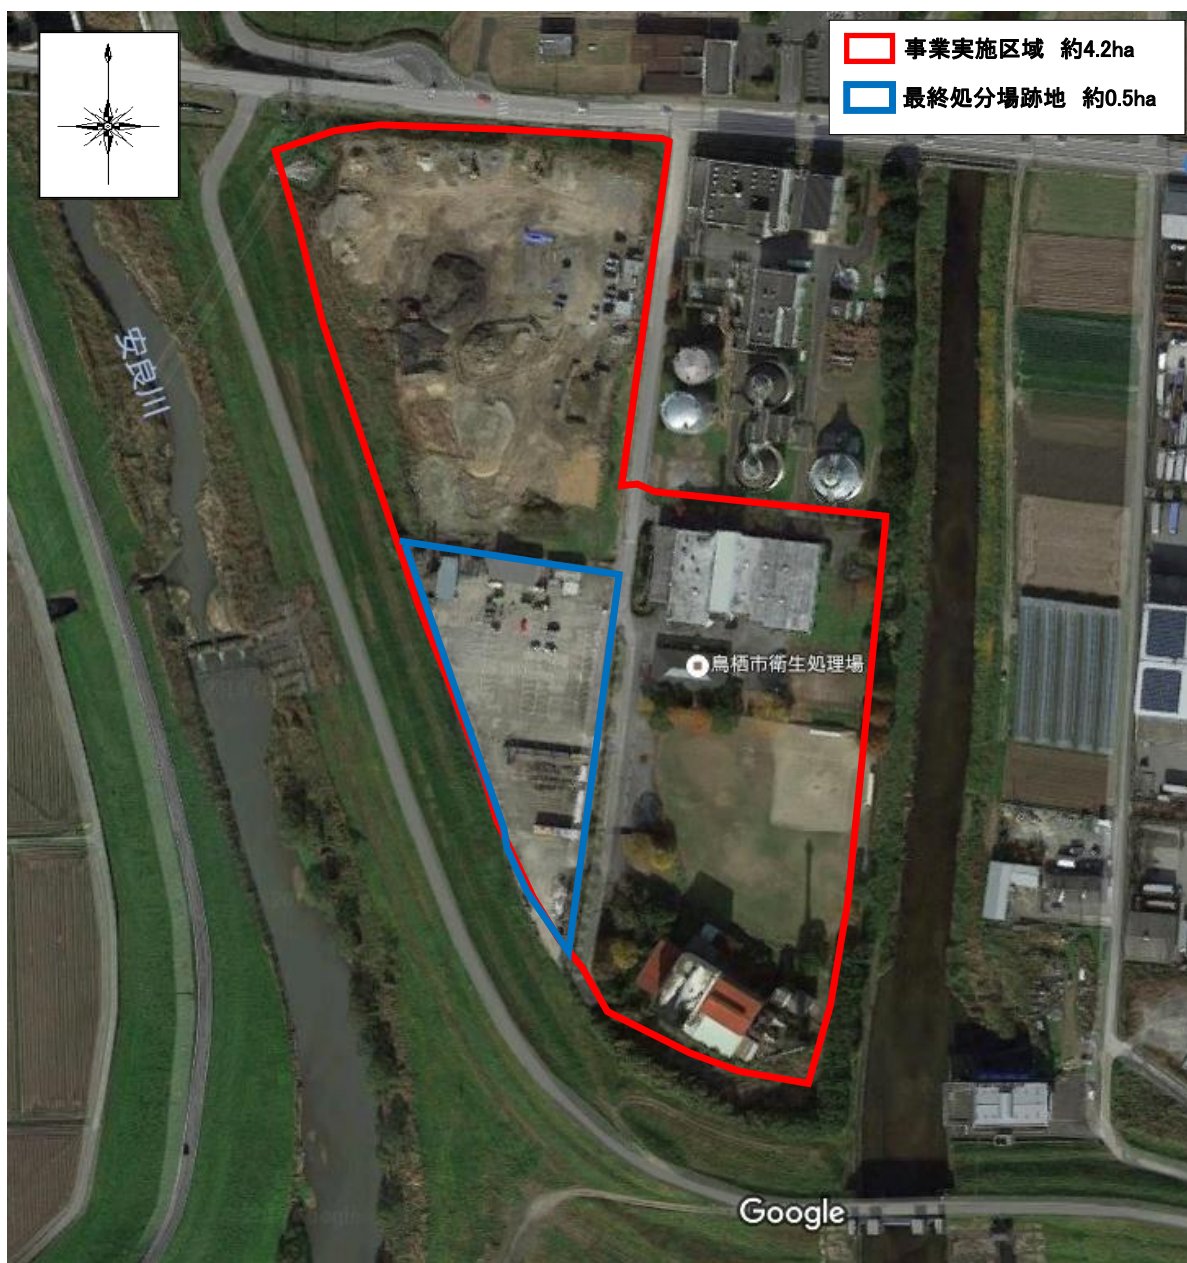


図 3 建設予定地

### 3 次期ごみ処理施設整備事業全体スケジュール

次期ごみ処理施設の施設基本計画から新施設稼働までのスケジュールを表 2 に示す。次期ごみ処理施設の稼働開始については、平成 36 年 4 月を目標としている。

表 2 佐賀県東部広域ごみ処理施設整備事業全体スケジュール（施設基本計画から新施設稼働まで）

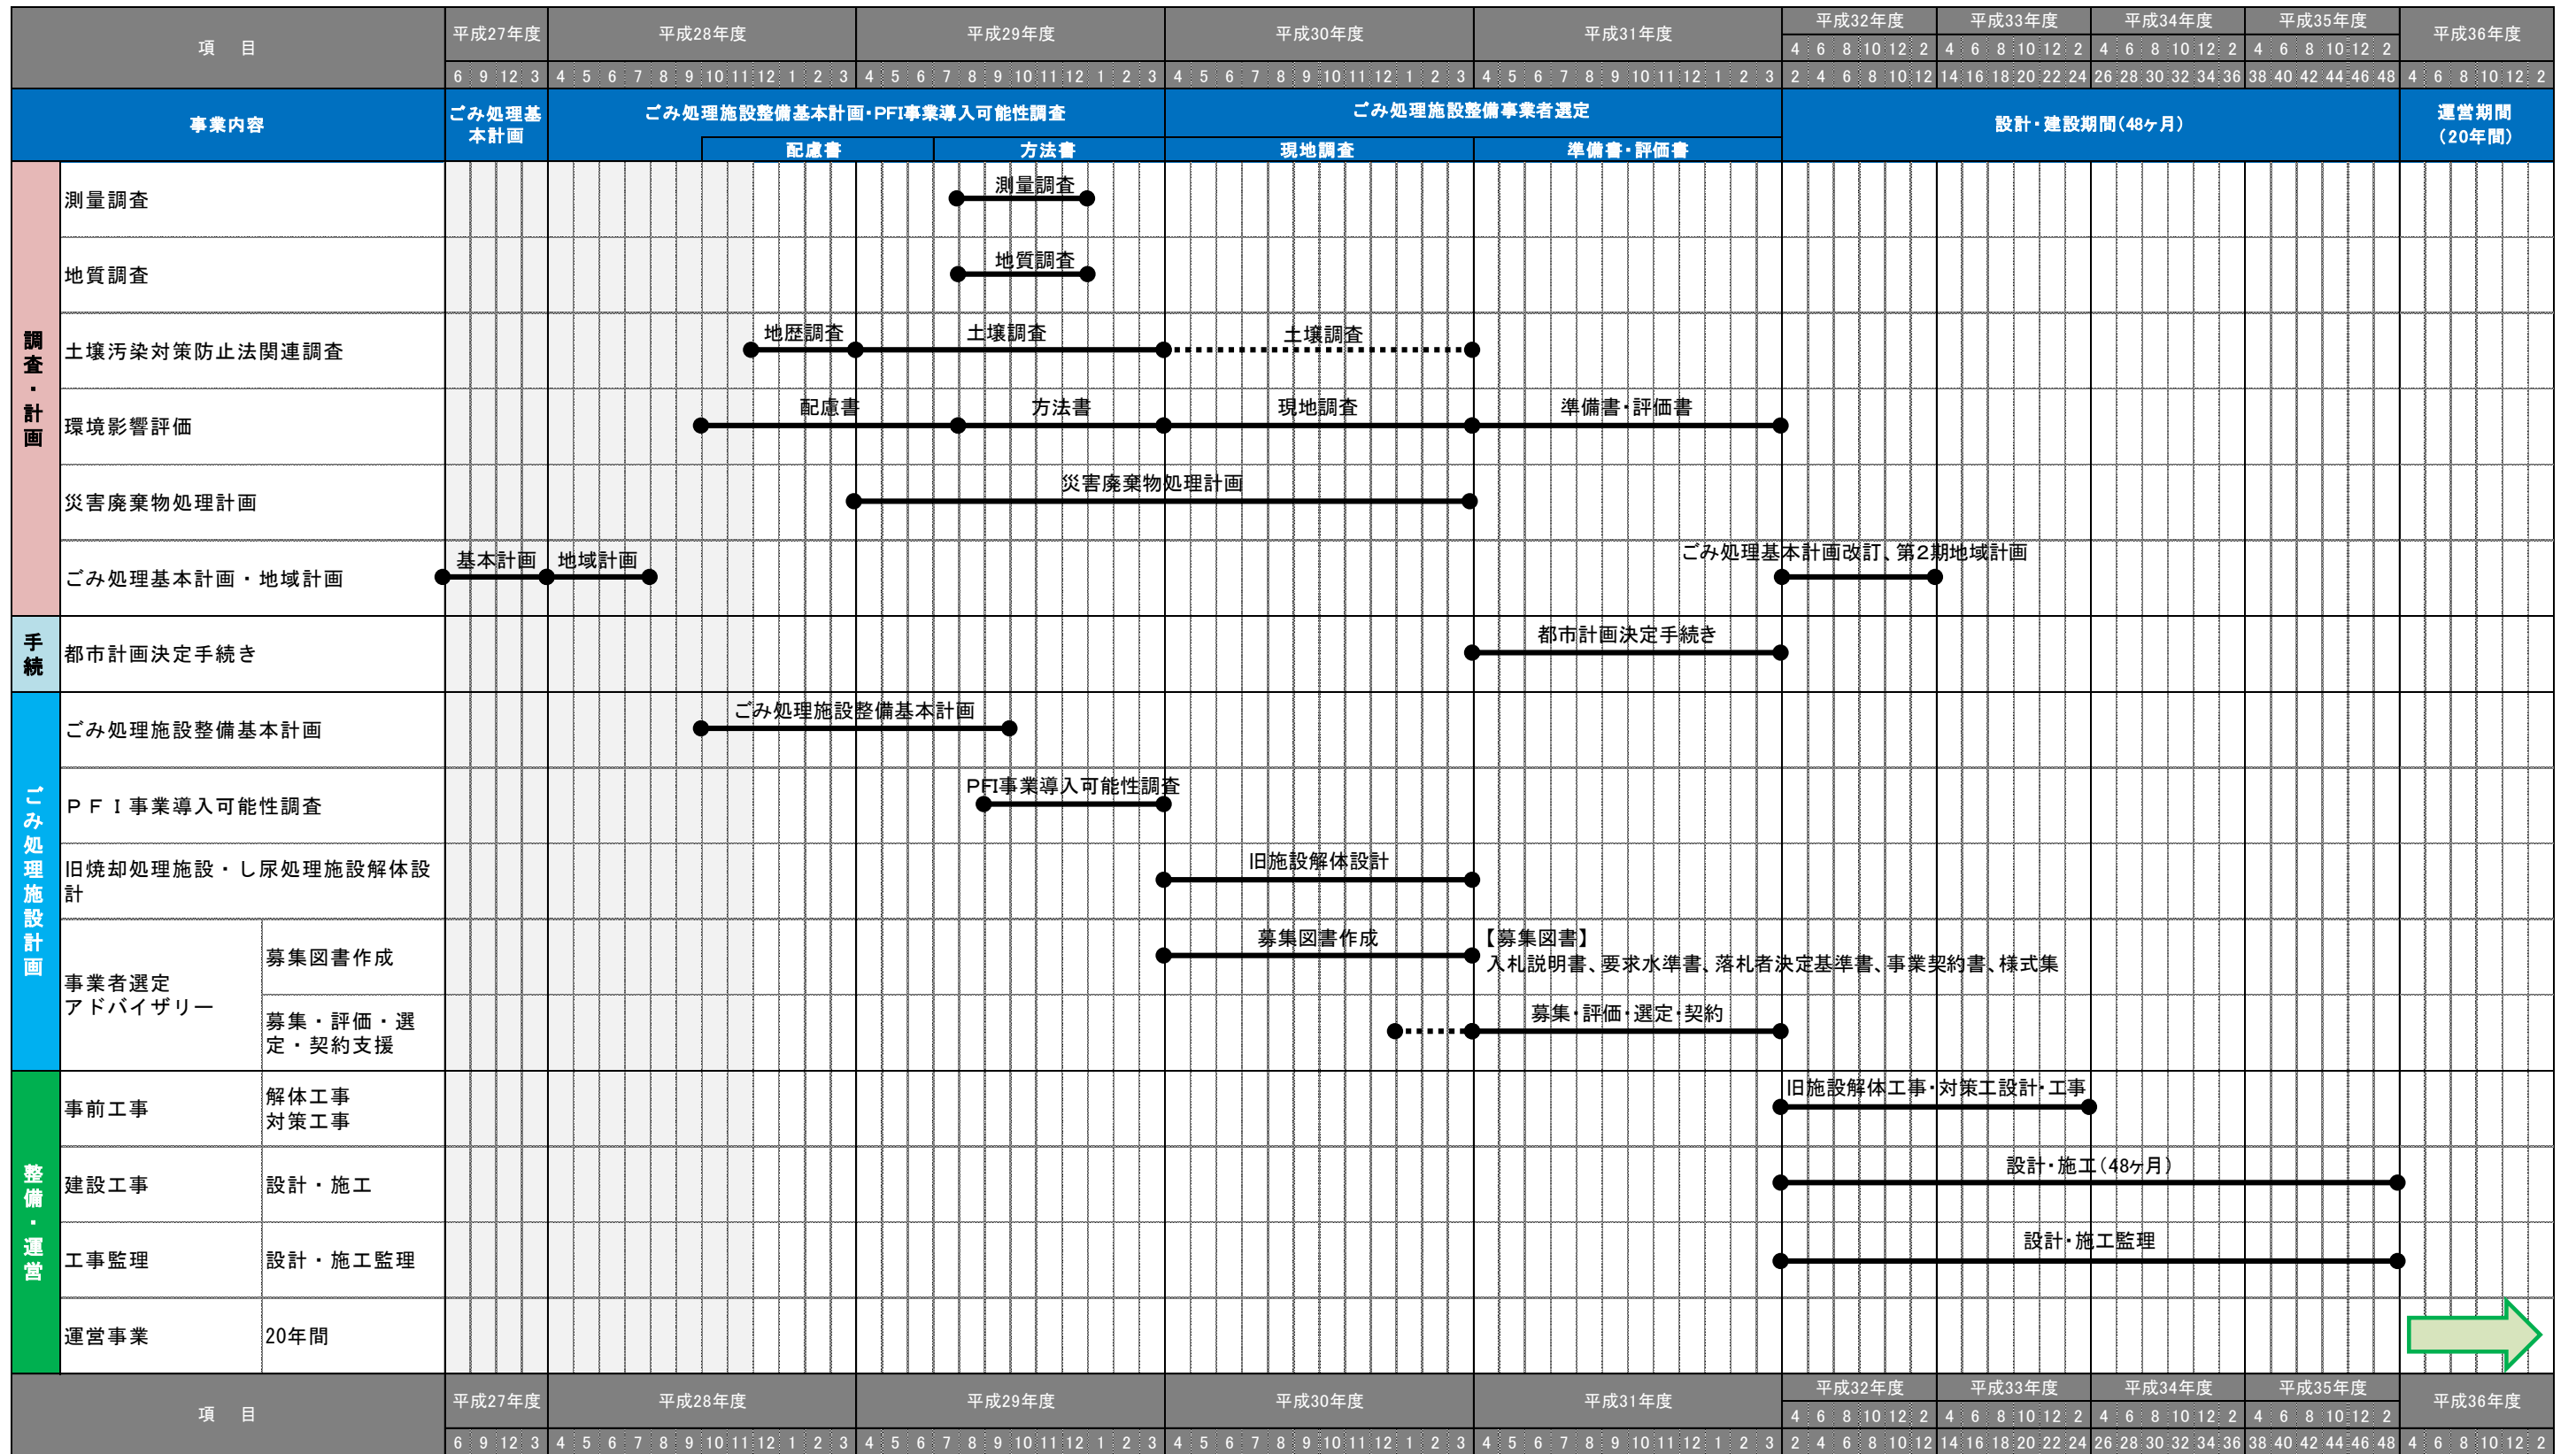


#### 4 検討委員会の開催日程と検討内容

検討委員会は、5回開催を予定している。検討委員会の開催日程と検討内容については表 3 に示す。表 4 にごみ処理施設整備基本計画策定及び PFI 事業導入可能性調査スケジュールを示す。

表 3 検討委員会の開催日程及び内容

区分	回数	実施時期	議 題
ごみ処理施設整備基本計画策定業務に係る審議	第 1 回	平成 29 年 1 月 5 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建設検討委員会における検討内容及び進め方について</li> <li>・2市3町における廃棄物処理システムと国内の処理技術の整理について</li> <li>・施設整備の基本方針について</li> <li>・比較対象とする処理システムの検討について</li> </ul>
	第 2 回	平成 29 年 2 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設基本諸元の確認</li> <li>・アンケート調査内容の確認</li> <li>・処理システム選定の評価項目、評価基準について</li> </ul>
		平成 29 年 2 月～3 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プラントメーカーへの技術提案依頼</li> <li>・最終生成物取引先に関するアンケート調査</li> </ul>
	第 3 回	平成 29 年 5 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査結果の報告</li> <li>・処理システムの比較・検討</li> <li>・処理システムの選定</li> <li>・中間答申案の検討</li> </ul>
PFI事業導入可能性調査業務に係る審議	第 4 回	平成 29 年 9 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基本条件の確認</li> <li>・意向調査内容の確認</li> </ul>
		平成 29 年 10 月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業方式に係る市場調査実施</li> </ul>
	第 5 回	平成 29 年 12 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業導入の評価</li> <li>・課題の確認</li> <li>・今後の作業及び事業契約までの全体スケジュールの確認</li> <li>・最終答申</li> </ul>

表 4 ごみ処理施設整備基本計画策定及びPFI事業導入可能性調査スケジュール

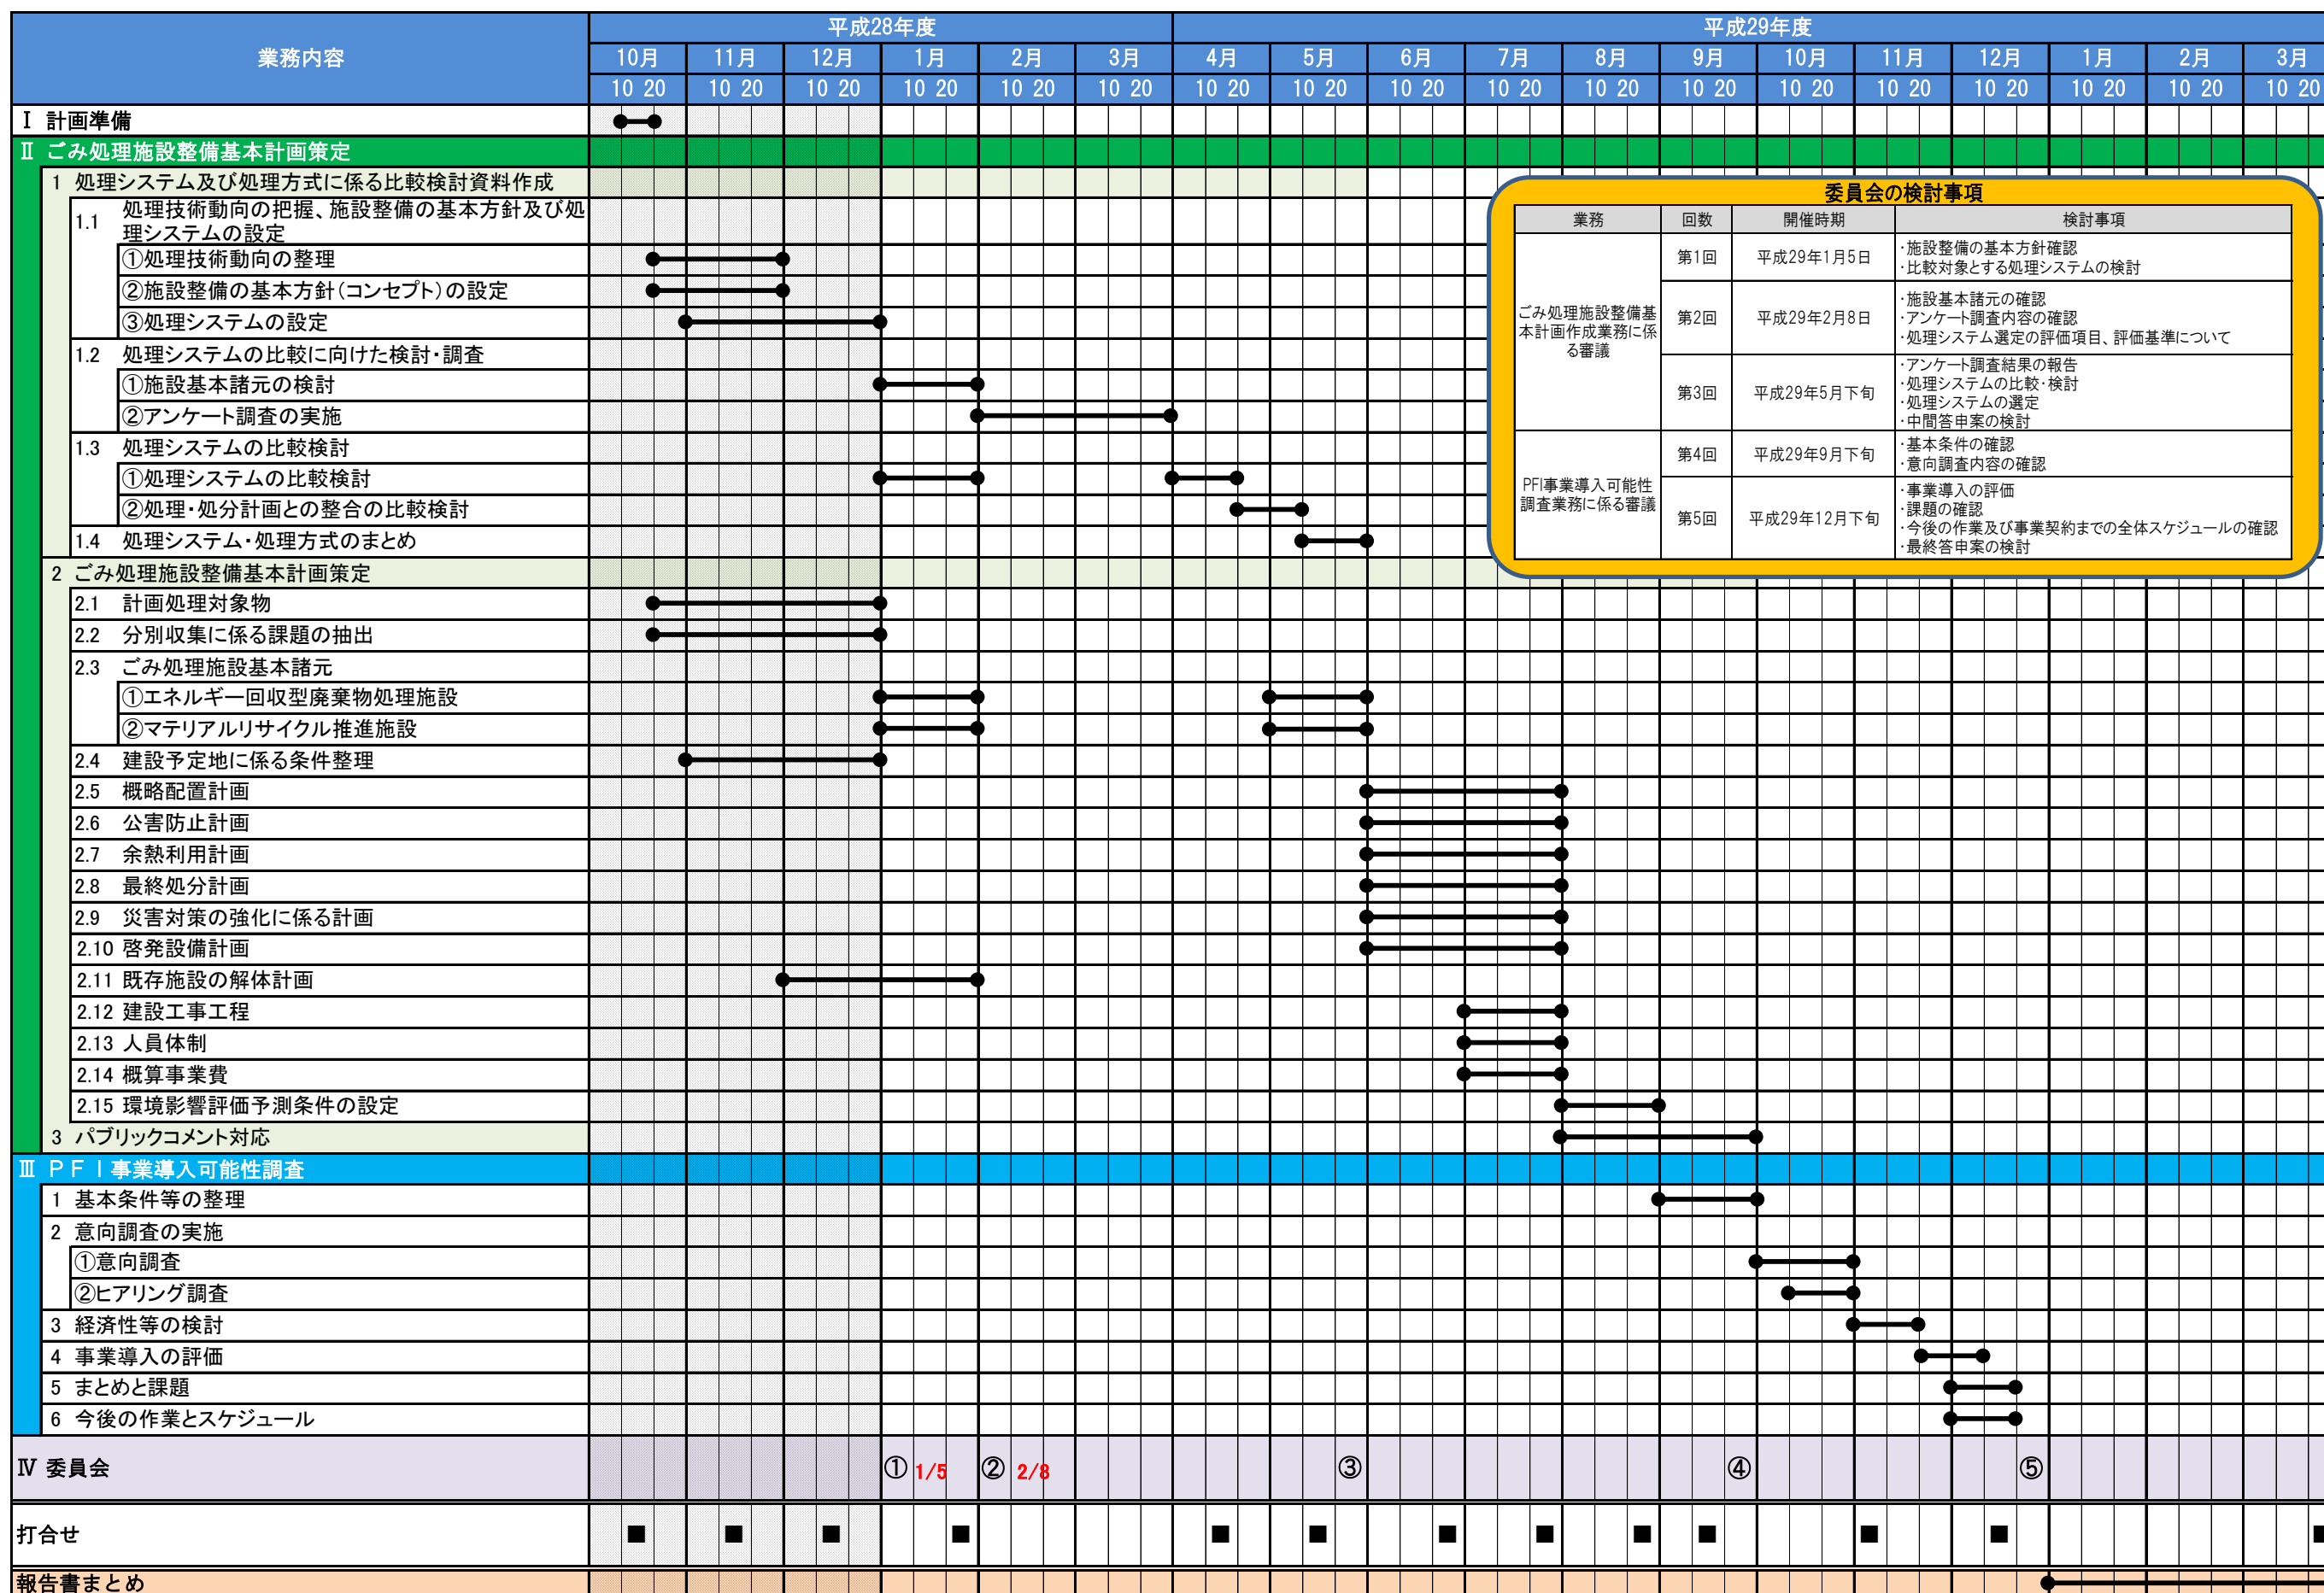

業務	回数	開催時期	検討事項
ごみ処理施設整備基本計画作成業務に係る審議	第1回	平成29年1月5日	・施設整備の基本方針確認 ・比較対象とする処理システムの検討
	第2回	平成29年2月8日	・施設基本諸元の確認 ・アンケート調査内容の確認 ・処理システム選定の評価項目、評価基準について
	第3回	平成29年5月下旬	・アンケート調査結果の報告 ・処理システムの比較・検討 ・処理システムの選定 ・中間答申案の検討
PFI事業導入可能性調査業務に係る審議	第4回	平成29年9月下旬	・基本条件の確認 ・意向調査内容の確認
	第5回	平成29年12月下旬	・事業導入の評価 ・課題の確認 ・今後の作業及び事業契約までの全体スケジュールの確認 ・最終答申案の検討
